

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****PROCESSO DE PAGAMENTO**

Exercício: 2021

Número: 001254

Data: 23/04/2021

**ORÇAMENTÁRIO**

<b>Credor:</b>	998 - EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP			
<b>CPF/CNPJ:</b>	03833213000192			
<b>Endereço:</b>	RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 110 - JOAQUIM ROMÃO			
<b>Cidade:</b>	JEQUIÉ / BA			
<b>Empenho:</b>	413 / 2021	<b>Liquidação:</b>	1	<b>Ficha:</b> 1450
<b>Orgão:</b>	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO	<b>Unidade:</b>	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>SubFunção:</b>	305 - Vigilância Epidemiológica	
<b>Programa:</b>	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM	<b>Fonte de Recurso:</b>	14 - Transf. de Recursos do SUS	
<b>PA:</b>	2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19			
<b>Elemento:</b>	33903900- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
<b>Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Vlr. Despesa</b>	<b>Retenções</b>	<b>Vlr. Líquido</b>
2021 - 413 - 1	JSC	31.067,00	0,00	31.067,00
<b>Total:</b>		31.067,00	0,00	31.067,00

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
71584-0	Banco do Brasil S.A.	7853 / BB - C/C 71584-0	4131	31.067,00
<b>Total:</b>				31.067,00
<b>Valor</b>	31.067,00			

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA  
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)  
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020**



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000413

Liquidação: 000717

Parcela: 1

DADOS CREDOR

Credor: 998 EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS , N° 110  
CNPJ/CPF: 03.833.213/0001-92

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1450  
Empenho: ORDINARIO  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19  
Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS  
Sub-Elemento: 3999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: 33  
Modalidade: DISPENSA

Processo: 2021/81  
Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 51.065,42  
Valor Liquidado: 31.067,00 trinta e um mil sessenta e sete reais  
Saldo Atual: 19.998,42  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 31.067,00  
Histórico: LIQ NF 454 1ª MEDIÇÃO DA REF. P.A. CAMPO AMÉRICA OS 539/2021 PERÍODO 23/03/2021 ATÉ 05/04/2021 COVID-19 (CG)

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 23/04/2021


Data: 23/04/2021

Jean Pereira dos Santos  
Secretário Administrativo  
DEPTO. COM. SAÚDE - PMJ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paulo Roberto de Oliveira  
Secretário Municipal de Saúde  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DECRETO nº 22.060/2021

Operador:

Kleber Ramos de Jesus  
Secretário Municipal de Controle e  
Transparência  
Decreto nº 22.065/21

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO****EXERCÍCIO:** 2021**NÚMERO:** 000413**DATA:** 22/03/2021**DADOS DO CREDOR**

Credor: 998 EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 110  
CNPJ/CPF: 03.833.213/0001-92 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

**CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS**

Ficha: 1450  
Empenho: ORDINARIO  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19  
Elemento: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS  
Sub-Elemento: 003999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Convênio:  
Cto de Custo:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: 33 Processo: 2021/81  
Modalidade: DISPENSA Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

Saldo Anterior: 53.000,00  
Valor do Empenho: 51.065,42 ( cinquenta e um mil sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)  
Saldo Atual: 1.934,58  
Histórico Prof. Contratação de Empresa Especializada para realização de Reforma imediata do Pronto Atendimento - PA, localizado no bairro Campo do América, Jequié-BA, visando a criação de leitos para atendimento ao Coronavírus (SarsCovid-19). (FPB-SC)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
22/03/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
22/03/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

*lean pereira dos santos*  
Secretaria Municipal de Saúde - PMU

SECRETÁRIO

*Pollana Leandro Oliveira*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Jequié/BA  
Decreto nº 22 060/2021

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****MUNICÍPIO DE JEQUIÉ**

Codigo de Verificação para Autenticação: 141443352



Gerado em 07/04/2021 11:00:58

<b>Data de Emissão</b> 07/04/2021	<b>Exigibilidade de ISS</b> Exigível	<b>Regime Tributário</b> Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>454</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Retido na Fonte	<b>Simplex</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município (2918001 - Jequié - BA)		

**PRESTADOR****Razão Social: EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Nome Fantasia: RIO ENGENHARIA

Endereço: Rua SIQUEIRA CAMPOS, 110, terreo - JOAQUIM ROMÃO

Jequié - BA - CEP: 45200-557

E-mail: contabilidade\_barbosa@hotmail.com - Fone: (73) 3526-4721 - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0001538 - CPF/CNPJ: 03.833.213/0001-92

**TOMADOR****Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE JEQUIÉ - FMJ**

Endereço: Praça PRC DA BANDEIRA, SN, 3º ANDAR - SALA 307 - CENTRO

Jequié - BA - CEP: 45.200-000

E-mail: saudejequeie@yahoo.com.br - Fone: (73) 3526-8900

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0013797 - CPF/CNPJ: 09.436.466/0001-09

**SERVIÇO****7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIV****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFRENTE BM 01-REFORMA IMEDIATA DO PRONTO ATENDIMENTO -PA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DO AMÉRICA, JEQUIÉ -BA, PARA CRIAÇÃO DE LEITOS VISANDO ATENDIMENTO AOS PACIENTES INFECTADOS COM O CORONA VIRUS-COVID 19. EMPRESA: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 2007.

Declaro que foram efetuados  
os serviços que se refere o  
recibo ou N.F. nº 454

Jequié, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

*Gabriel de Andrade Cerqueira*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0519688457

*Jacqueline Oliveira Andrade*  
Diretora do Departamento  
Administrativo e Financeiro  
Decreto nº 22.097/2021

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
31.067,00	0,00	0,00	31.067,00	4,43	1.376,27
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29.690,73

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.jequie.ba.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Nº do Processo: 81/2021  
 Data: 22/03/2021  
 Contrato Nº: 44/2021  
 Dispensa Nº: 33/2021  
 Nº da Autorização: 539/2021

**ORDEM DE SERVIÇO 539/2021**

OBS.: NO MOMENTO DA ENTREGA DOS ITENS, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DESTES DOCUMENTOS.

Condição de Entrega: IMEDIATA

Credor: 998 - EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP ✓ Telefone: 7335264721  
 Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 110 Bairro: JOAQUIM ROMÃO  
 CNPJ/CPF: 03.833.213/0001-92 Cidade: JEQUIE Estado: BA

Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Proj./Ativ.: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 ✓  
 Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte de Recurso: 14 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA IMEDIATA DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, LOCALIZADO NO BAIRRO CAMPO DO AMÉRICA, JEQUIÉ-BA, VISANDO A CRIAÇÃO DE LEITOS PARA ATENDIMENTO AO CORONAVÍRUS (SARSCOVID-19).

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD.	UNID.	PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	42363	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, LOCALIZADO NO BAIRRO CAMPO DO AMÉRICA, JEQUIÉ-BA.	1	UN	--	51.065,42	51.065,42
						<b>TOTAL:</b>	<b>51.065,42</b>

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA

*Handwritten signature*  
 Responsável pela Secretaria  
 Jequié - BA  
 22/03/2021

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA AFM/OS

LOCAL DE ENTREGA:

OBS: REFERENTE A REFORMA DO PA.

## BOLETIM DE MEDIÇÃO



Secretaria de Infraestruturas e Serviços Públicos

MEDIÇÃO Nº: 1

EMPRESA: EPAN CONSTRUTORA LTDA-EPP

CONTRATO Nº: 44/2021

BDI:20,34%

OBRA: PA - PRONTO ATENDIMENTO

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 31.067,00

LOCAL: CAMPO DO AMERICA

VALOR ACUMULADO: R\$ 31.067,01

VALOR DO CONTRATO: 51.065,42

PERÍODO: 23/03/2021 à 05/04/2021

SALDO A MEDIR: R\$ 19.998,42

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	CONTRATO			DESENVOLVIMENTO FÍSICO				DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO				% ACUMULADO
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS ATUAL	ACUMULADO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS ATUAL	ACUMULADO	SALDO	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS</b>													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	2,25	381,32	857,97		2,25	2,25	-	-	857,97	857,97	R\$ -	100,00%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,10	101,92	10,19		0,10	0,10	-	-	10,19	10,19	R\$ 0,00	100,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,50	3,25	40,63		10,00	10,00	2,50	-	32,50	32,50	R\$ 8,13	80,00%
1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,80	3,50	44,80		8,00	8,00	4,80	-	28,00	28,00	R\$ 16,80	62,50%
1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,25	31,23	7,81		0,25	0,25	-	-	7,81	7,81	R\$ 0,00	100,00%
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_09/2018	m²	5,00	119,33	596,65		0,00	0,00	5,00	-	-	0,00	R\$ 596,65	0,00%
	<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>													
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO</b>													
2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5CM. AF_07/2016	m²	0,30	31,32	9,40		0,30	0,30	-	-	9,40	9,40	R\$ 0,00	100,00%
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	33,42	42,03	1.404,64		0,00	0,00	33,42	-	-	0,00	R\$ 1.404,64	0,00%
	<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>													
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES</b>													
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	12,50	46,46	580,75		11,00	11,00	1,50	-	511,06	511,06	R\$ 69,69	88,00%
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	12,50	4,99	62,38		11,00	11,00	1,50	-	54,89	54,89	R\$ 7,49	88,00%
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	478,39	14,77	7.065,82		211,64	211,64	266,75	-	3.125,92	3125,92	R\$ 3.839,90	44,24%
3.4	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	m²	89,43	8,68	774,46		75,03	75,03	14,40	-	649,76	649,76	R\$ 124,70	83,90%
3.5	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	m²	89,43	23,91	2.138,27		75,03	75,03	14,40	-	1.793,97	1793,97	R\$ 344,30	83,90%
3.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	33,30	22,13	736,93		7,53	7,53	25,77	-	166,64	166,64	R\$ 570,29	22,61%
3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO (GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	10,98	24,25	266,27		0,00	0,00	10,98	-	-	0,00	R\$ 266,27	0,00%
3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	72,40	71,67	5.188,91		26,84	26,84	45,56	-	1.923,62	1923,62	R\$ 3.265,29	37,07%
3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	60,36	27,44	1.656,28		40,00	40,00	20,36	-	1.097,60	1097,60	R\$ 558,68	66,27%
	<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>													
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS</b>													
4.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	und	12,00	11,24	134,88		8,00	8,00	4,00	-	89,92	89,92	R\$ 44,96	66,67%
4.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	8,00	9,10	72,80		6,00	6,00	2,00	-	54,60	54,60	R\$ 18,20	75,00%

Gabriel de Andrade Cerqueira  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0519688457

Pompilio Sampaio Neto  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA


4.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	48,67	48,67	0,00	0,00	1,00	-	-	0,00	R\$ 48,67	0,00%
4.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	136,86	273,72	1,00	1,00	1,00	-	136,86	136,86	R\$ 136,86	50,00%
4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	4,00	23,38	93,52	4,00	4,00	-	-	93,52	93,52	R\$ -	100,00%
4.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	1,00	31,73	31,73	1,00	1,00	-	-	31,73	31,73	R\$ -	100,00%
4.7	TORNEIRA DE MESA BICA CURTA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101377, DA AZZO OU SIMILAR	und	6,00	85,48	512,88	4,00	4,00	2,00	-	341,92	341,92	R\$ 170,96	66,67%
4.8	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	und	1,00	55,96	55,96	0,00	0,00	1,00	-	-	0,00	R\$ 55,96	0,00%
4.9	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	und	1,00	11,94	11,94	1,00	1,00	-	-	11,94	11,94	R\$ -	100,00%
4.10	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	9,00	34,06	306,54	0,00	0,00	9,00	-	-	0,00	R\$ 306,54	0,00%
4.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	und	1,00	217,37	217,37	1,00	1,00	-	-	217,37	217,37	R\$ -	100,00%
4.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	3,00	79,29	237,87	2,00	2,00	1,00	-	158,58	158,58	R\$ 79,29	66,67%
4.13	ASSENTAMENTO DE CUBA INOX EM BANCADA DE MÁRMORE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ENGATE, SIFÃO, VALVULA E TORNEIRA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CUBA INOX.	und	2,00	378,88	757,76	2,00	2,00	-	-	757,76	757,76	R\$ -	100,00%
4.14	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	3,00	374,92	1.124,76	3,00	3,00	-	-	1.124,76	1124,76	R\$ -	100,00%
4.15	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	16,00	67,94	1.087,04	0,00	0,00	16,00	-	-	0,00	R\$ 1.087,04	0,00%
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>													
<b>5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE</b>													
5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	10,00	44,41	444,10	8,00	8,00	2,00	-	355,28	355,28	R\$ 88,82	80,00%
5.2	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	5,00	23,97	119,85	3,00	3,00	2,00	-	71,91	71,91	R\$ 47,94	60,00%
5.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00	25,97	51,94	1,00	1,00	1,00	-	25,97	25,97	R\$ 25,97	50,00%
5.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	8,00	27,38	219,04	6,00	6,00	2,00	-	164,28	164,28	R\$ 54,76	75,00%
5.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	10,00	29,39	293,90	10,00	10,00	-	-	293,90	293,90	R\$ -	100,00%
5.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	3,00	36,05	108,15	2,00	2,00	1,00	-	72,10	72,10	R\$ 36,05	66,67%
5.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	5,00	66,17	330,85	5,00	5,00	-	-	330,85	330,85	R\$ -	100,00%
5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	72,00	4,04	290,88	72,00	72,00	-	-	290,88	290,88	R\$ -	100,00%
5.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	8,00	184,25	1.474,00	7,00	7,00	1,00	-	1.289,75	1289,75	R\$ 184,25	87,50%
5.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1,00	41,04	41,04	1,00	1,00	-	-	41,04	41,04	R\$ -	100,00%
5.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	und	5,00	6,11	30,55	5,00	5,00	-	-	30,55	30,55	R\$ -	100,00%
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>													
<b>6 COBERTURA E FORRO</b>													
6.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	12,80	48,50	620,80	0,00	0,00	12,80	-	-	0,00	R\$ 620,80	0,00%
6.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	17,50	81,82	1.431,85	17,50	17,50	-	-	1.431,85	1431,85	R\$ -	100,00%
6.3	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	81,12	69,76	5.658,93	58,00	58,00	23,12	-	4.046,08	4046,08	R\$ 1.612,85	71,50%
6.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	35,40	41,01	1.451,75	35,40	35,40	-	-	1.451,75	1451,75	R\$ 0,00	100,00%
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>													
<b>7 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS</b>													

Gabriel de Almeida Corqueira  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0519688457

Pompilio Sampaio Neto  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA

7.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00	87,75	877,50		2,00	2,00	8,00	-	175,50	175,50	R\$ 702,00	20,00%
7.2	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	und	4,00	292,40	1.169,60		2,00	2,00	2,00	-	584,80	584,80	R\$ 584,80	50,00%
7.3	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	41,60	7,73	321,57		20,00	20,00	21,60	-	154,60	154,60	R\$ 166,97	48,08%
7.4	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFIS BUZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFIS E FECHADURA	m²	2,52	387,95	977,63		2,52	2,52	-	-	977,63	977,63	R\$ 0,00	100,00%
7.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	1,00	390,30	390,30		1,00	1,00	-	-	390,30	390,30	R\$ -	100,00%
7.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	7,00	328,64	2.300,48		0,00	0,00	7,00	-	-	0,00	R\$ 2.300,48	0,00%
7.7	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO - PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	m²	6,09	427,21	2.601,71		6,09	6,09	-	-	2.601,71	2601,71	R\$ 0,00	100,00%
7.8	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	1,00	309,19	309,19		1,00	1,00	-	-	309,19	309,19	R\$ -	100,00%
7.9	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	0,25	179,97	44,99		0,25	0,25	-	-	44,99	44,99	R\$ 0,00	100,00%
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>														
<b>8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
8.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	3,00	15,62	46,86		1,50	1,50	1,50	-	23,43	23,43	R\$ 23,43	50,00%
8.2	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	1,00	240,07	240,07		1,00	1,00	-	-	240,07	240,07	R\$ -	100,00%
8.3	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	4,83	101,11	488,36		4,83	4,83	-	-	488,36	488,36	R\$ 0,00	100,00%
8.4	MANEJO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REF:OBRA SERGIPETEC)	und	10,00	140,83	1.408,30		10,00	10,00	-	-	1.408,30	1408,30	R\$ -	100,00%
8.5	LIMPEZA GERAL	m²	426,00	2,14	911,64		226,00	226,00	200,00	-	483,64	483,64	R\$ 428,00	53,05%
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>														
<b>Total do Contrato</b>					<b>51.065,42</b>						<b>31.067,00</b>	<b>#####</b>	<b>19.998,42</b>	<b>60,84%</b>
<b>Total da Medição</b>														
<b>31.067,00</b>														

  
**Daniel de Andrade Cerqueira**  
 Engenheiro Civil  
 - A-BA nº 0519688457

  
**Pompilio Sampaio Neto**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA-BA 10371  
 EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
 CNPJ 03.833.213/0001-92  
 JEQUIÉ - BAHIA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20210495172**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**POMPILO SAMPAIO NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0503992623**

Registro: **10371/D BA**

Empresa contratada: **EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Registro: **0000109950-BA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jequié**

**TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS**

Complemento:

Bairro: **JEQUIEZINHO**

Cidade: **JEQUIÉ**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**

Nº: **s/n**

CEP: **45206100**

Contrato: **44/2021**

Celebrado em: **22/03/2021**

Valor: **R\$ 51.065,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA ademario eloi silveira**

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **campo do america**

Cidade: **JEQUIÉ**

UF: **BA**

CEP: **45200000**

Data de Início: **22/03/2021**

Previsão de término: **10/04/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jequié**

CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**

**4. Atividade Técnica**

12 - Execução

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE

Quantidade

Unidade

1,00

un

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

655,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Reforma do PA Campo do América - Jequié Bahia.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Jequié* Local *07* de *Abri* data *de 2021*

*Pompilio Sampaio Neto*  
POMPILO SAMPAIO NETO - CPF: 084.460.165-91

Prefeitura Municipal de Jequié - CNPJ: 13.894.878/0001-60

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **06/04/2021**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **52830958**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Z53AZ  
Impresso em: 07/04/2021 às 09:28:29 por: , ip: 170.84.226.215

www.crea-ba.org.br  
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br  
Fax: (71) 3453-8989

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº BA20210492239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0519688457  
Registro: 3000107444BA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
**PRAÇA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS**  
Complemento:  
Cidade: **JEQUIÉ**

Bairro: **JEQUIEZINHO**  
UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**  
Nº: **S/N**  
CEP: **45200610**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **12/03/2021**  
Valor: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA ADEMÁRIO ELÓI SILVEIRA**  
Complemento: **PA - CAMPO DO AMERICA**  
Cidade: **JEQUIÉ**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **BA**

Nº: **S/N**  
CEP: **45203130**  
Coordenadas Geográficas: **-13.855861, -40.077439**

Data de Início: **23/03/2021** Previsão de término: **23/06/2021** Códigos: **Não Especificado**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**

CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**

**4. Atividade Técnica**

**13 - Fiscalização**

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

Quantidade  
655,00  
Unidade  
m2

**17 - Elaboração**

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

Quantidade  
655,00  
Unidade  
m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE

655,00 m2

320 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE

655,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REFORMA DO PONTO DE APOIO - PA CAMPO DO AMERICA NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Gabriel de Andrade Cerqueira*  
GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA - CPF: 066.373.255-70

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - CNPJ: 13.894.878/0001-60

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **12/04/2021** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **52826454**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 145xY  
Impresso em: 13/04/2021 às 17:01:18 por: ip: 187.109.212.22

www.crea.org.br  
Tel: (71) 3453-8989

crea@crea.org.br  
Fax: (71) 3453-8989

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





# EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP

Relatório de Atividade Diária - RAD

Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA  
Nome: CÁSSIO BARRETO Função: Estagiário

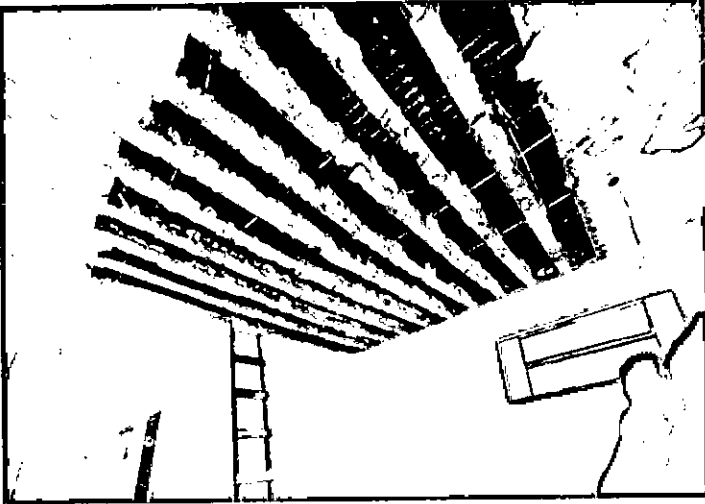


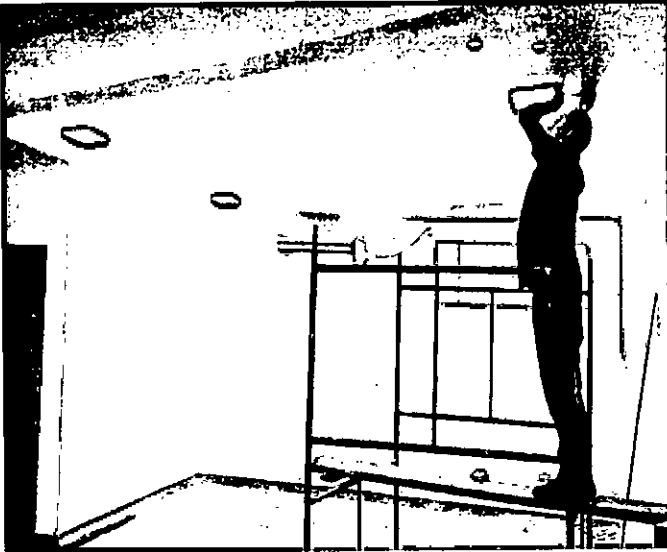
FOTO Antes	FOTO Depois
	
PROBLEMA: Forro	
SOLUÇÃO: Aplicação de forro com placa de gesso	
EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN	

FOTO Antes	FOTO Depois
	
PROBLEMA: Parte da eletricidade	
SOLUÇÃO: iluminação	
EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN	

*Pompilio Sampaio Neto*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
EQUIPE - BAHIA

EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000  
SUPERVISOR: CÁSSIO BARRETO - TEL: (73) 98111-0839



# EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP

Relatório de Atividade Diária - RAD

Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA  
Nome: Cássio Barreto Função: Estagiário

FOTO Antes

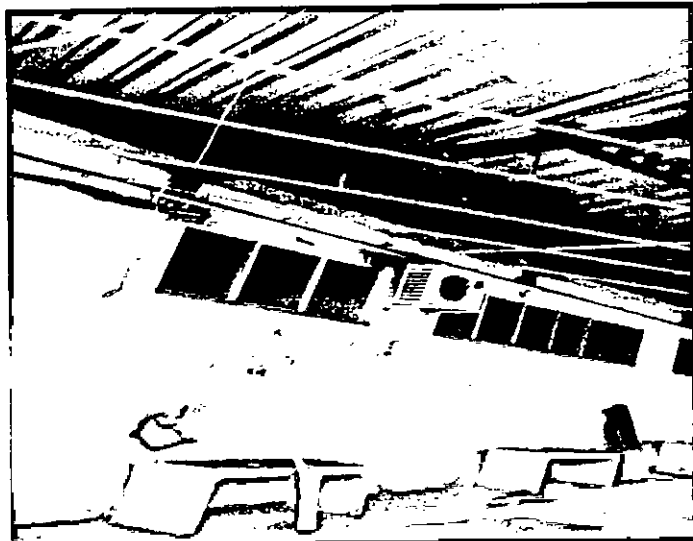


FOTO Depois



PROBLEMA: Forro e pintura da área externa


SOLUÇÃO: Reforma

EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN

FOTO Antes



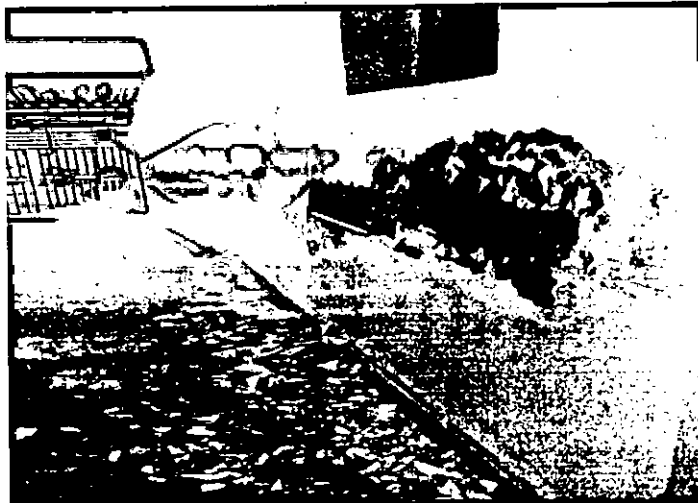FOTO Depois



PROBLEMA: Acabamento e Pintura da área interna

SOLUÇÃO: Reforma

EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN

*Gabriel de Andrade Corqueira*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0519888457

*Pompilio Sampaio Neto*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA

EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000  
SUPERVISOR: Cássio Barreto - TEL: (73) 98111-0839



# EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP

Relatório de Atividade Diária - RAD

Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA  
Nome: CÁSSIO BARRETO Função: Estagiário

FOTO Antes


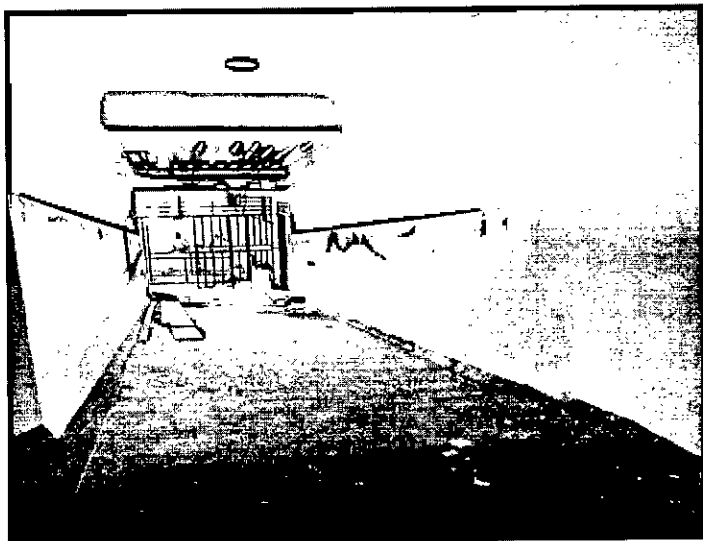


FOTO Depois

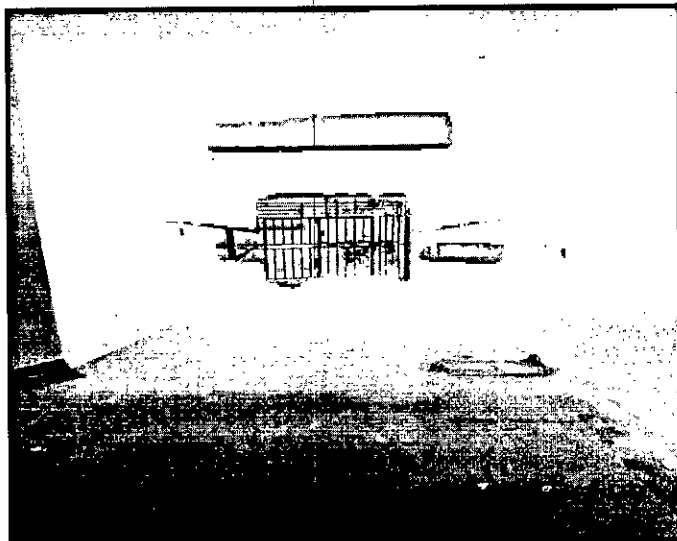

PROBLEMA: Acabamento e Pintura da área interna


SOLUÇÃO: Reforma

EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN

FOTO Antes



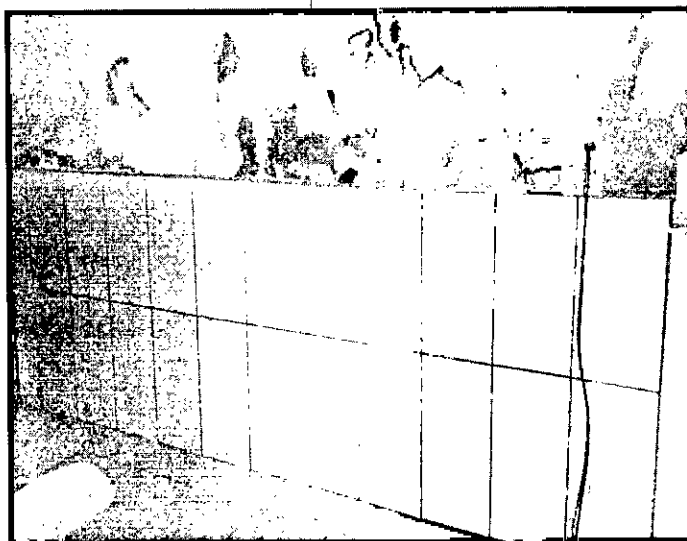FOTO Depois



PROBLEMA: Revestimento de Parede

SOLUÇÃO: Revestimento de parede, área sala

EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN

*Pompilio Sampaio Neto*

ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371

EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA

*Gabriel de Andrade Cerqueira*  
Engenheiro Civil

CREA-BA nº 0519688457

EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000


SUPERVISOR: CÁSSIO BARRETO - TEL: (73) 98111-0839



# EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP

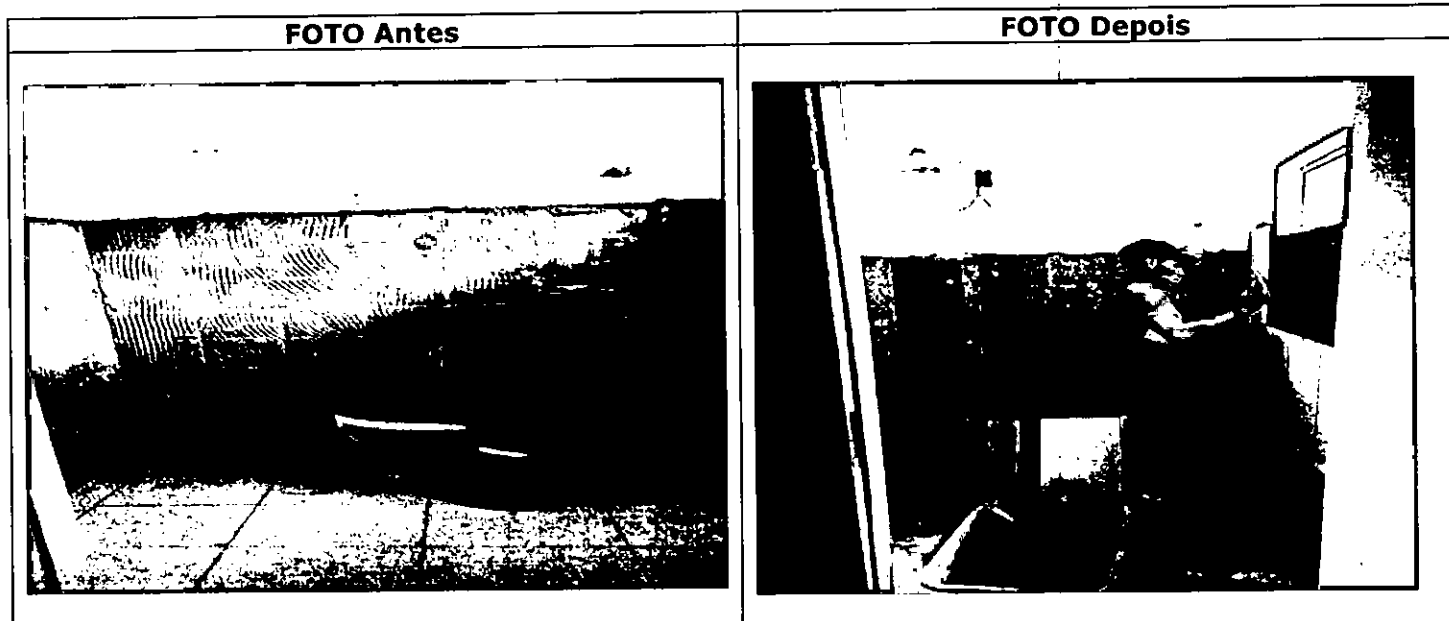
Relatório de Atividade Diária - RAD

Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA  
Nome: Cássio Barreto      Função: Estagiário



PROBLEMA: Revestimento de Parede, Area banheiro  
SOLUÇÃO: Revestimento de parede, área banheiro

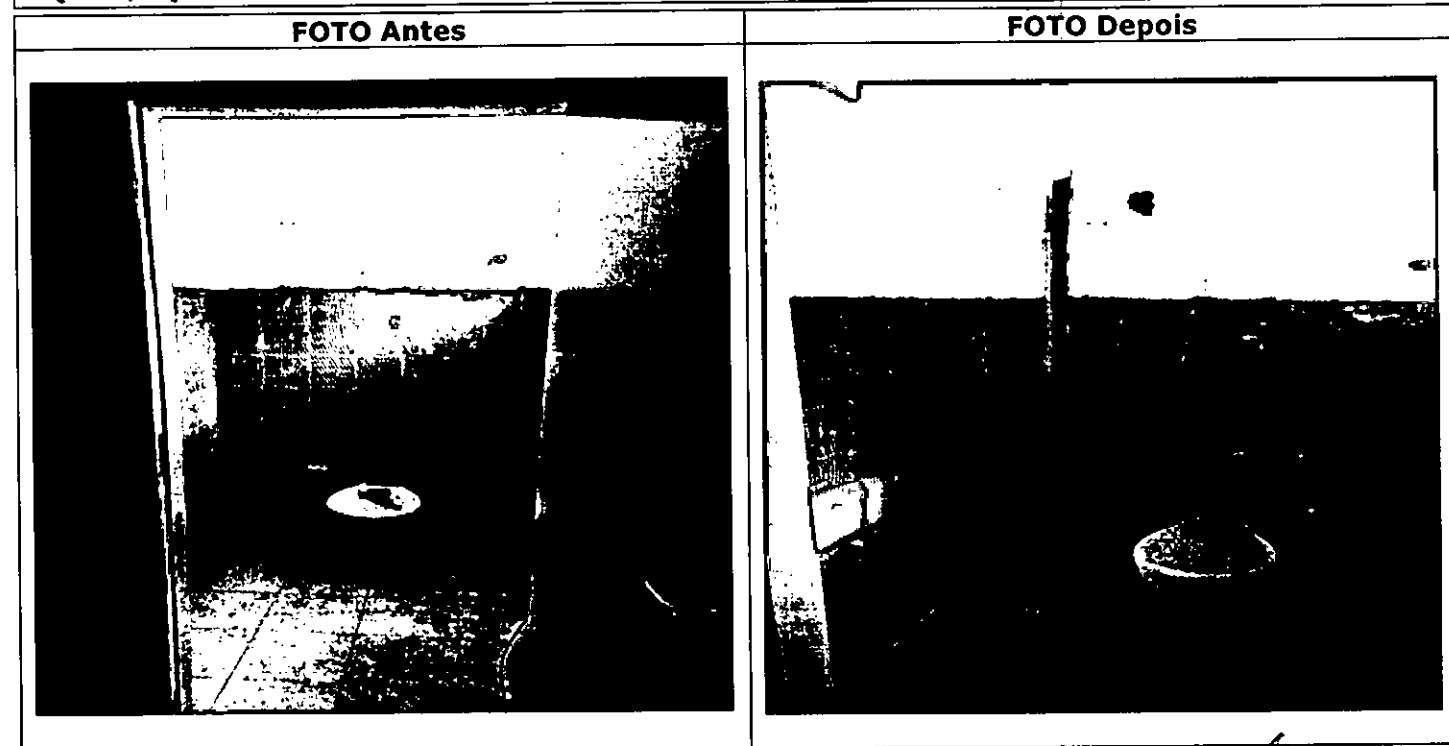EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN



PROBLEMA: Revestimento de Parede, Area banheiro  
SOLUÇÃO: Revestimento de parede, área banheiro

EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN

*Pompilio Sampaio Neto*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA

EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000  
SUPERVISOR: Cássio Barreto - TEL: (73) 98111-0839



*Gabriel de Andrade Cerqueira*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0519668457



# EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP

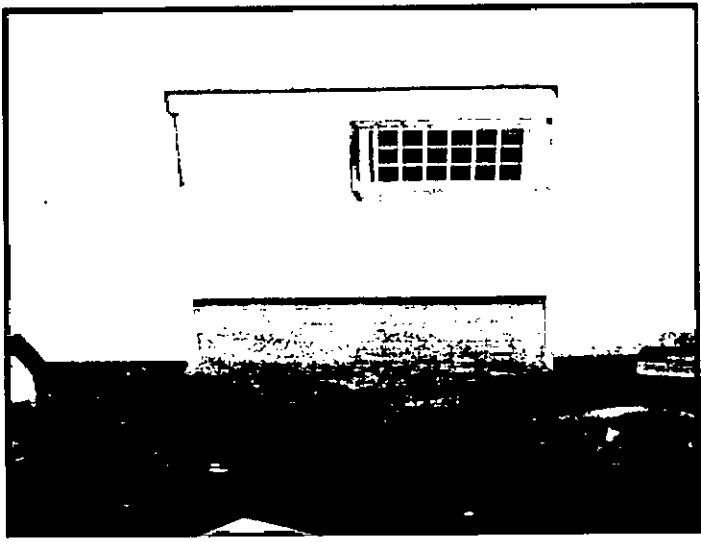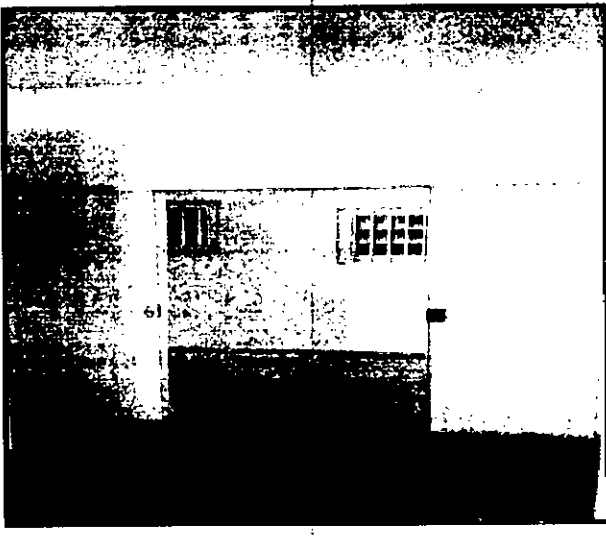Relatório de Atividade Diária - RAD

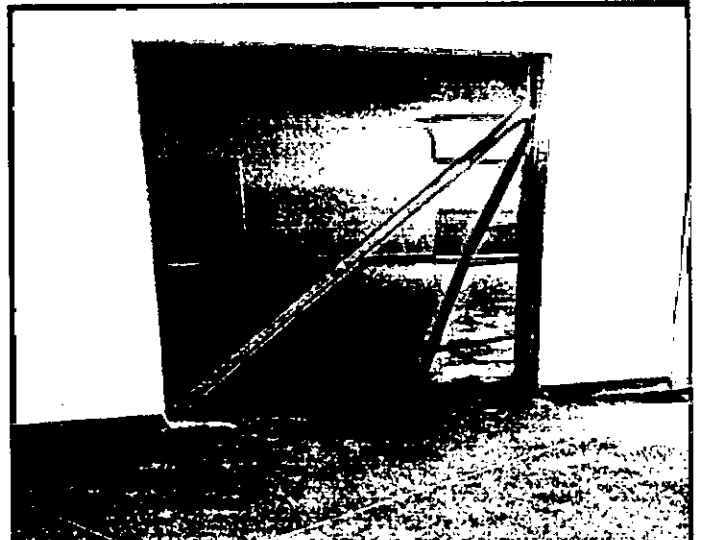
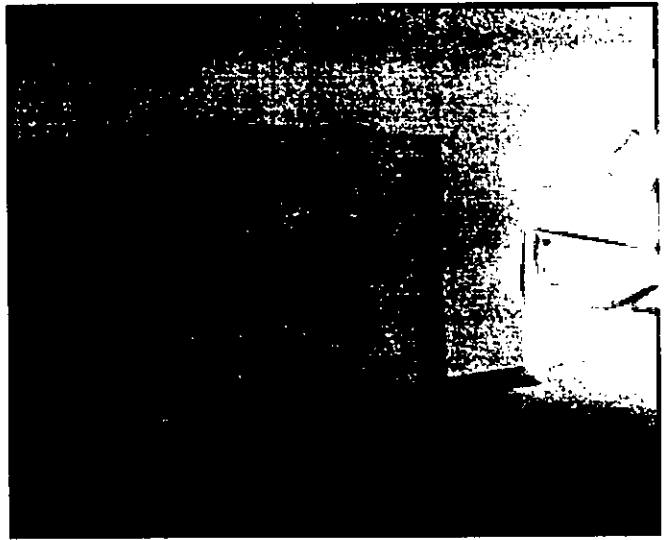
Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA  
Nome: CÁSSIO BARRETO      Função: Estagiário

FOTO Antes	FOTO Depois
	

PROBLEMA:

SOLUÇÃO: Porta de Blidex

EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN

FOTO Antes	FOTO Depois
	

PROBLEMA:

SOLUÇÃO: Porta com Divisória de Madeira

EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN

*Pomilio Sampato Neto*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10974  
EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA

EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000  
SUPERVISOR: CÁSSIO BARRETO - TEL: (73) 98111-0839

*Gabriel de Andrade Corqueira*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0519688457



# EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP

Relatório de Atividade Diária - RAD

Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA  
Nome: CÁSSIO BARRETO      Função: Estagiário

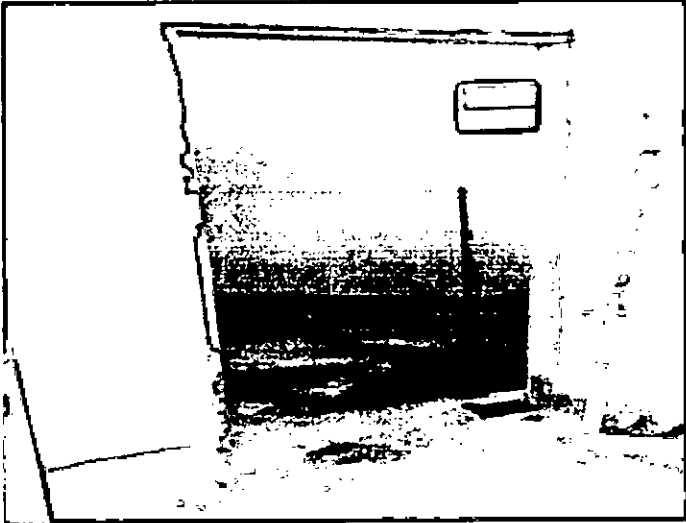
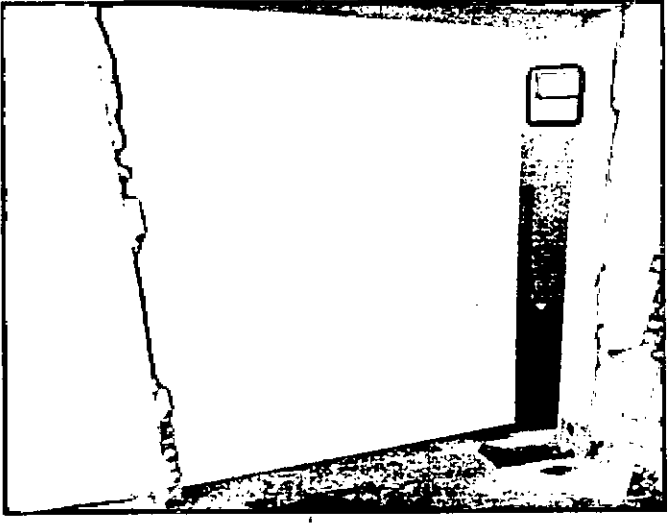
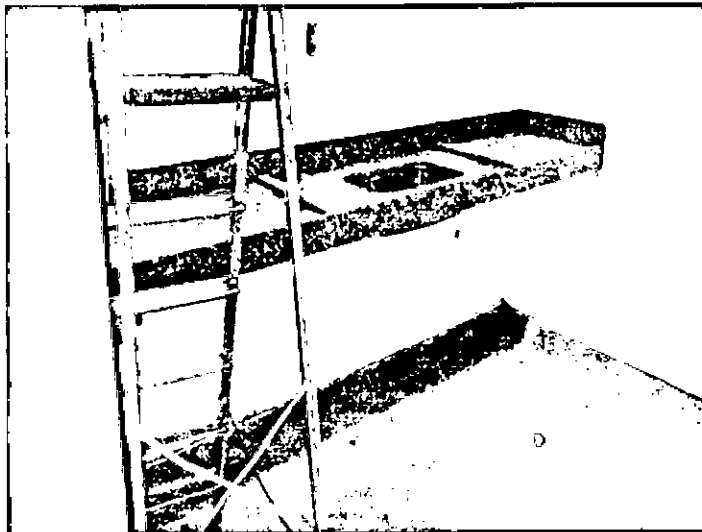
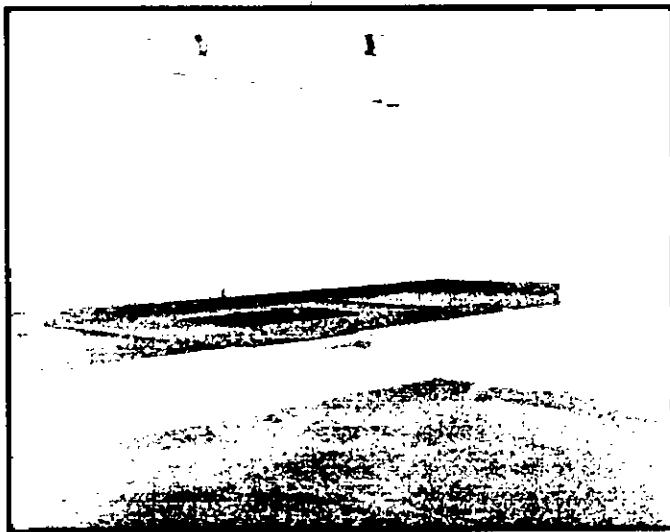
FOTO Antes	FOTO Depois
	
PROBLEMA:	
SOLUÇÃO: Porta de Madeira	
EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN	

FOTO Antes	FOTO Depois
	
PROBLEMA:	
SOLUÇÃO: Instalação da Pia	
EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN	

*Gabriel do Prado Cerqueira*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0519668457

EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000

SUPERVISOR: CÁSSIO BARRETO - TEL: (73) 98111-0839

*Pompilio Sampaio Neto*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP  
03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA



# EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP

## Relatório de Atividade Diária - RAD

Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA  
Nome: CÁSSIO BARRETO Função: Estagiário

FOTO Antes	FOTO Depois
PROBLEMA:	
SOLUÇÃO: Porta de Blidex	
EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN	

FOTO Antes	FOTO Depois
PROBLEMA:	
SOLUÇÃO: Instalação de Ar condicionado e Revestimento nos Vitroses.	
EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN	

*Gabriel de Andrade Cerqueira*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0519688457

EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000  
SUPERVISOR: CÁSSIO BARRETO - TEL: (73) 98111-0839

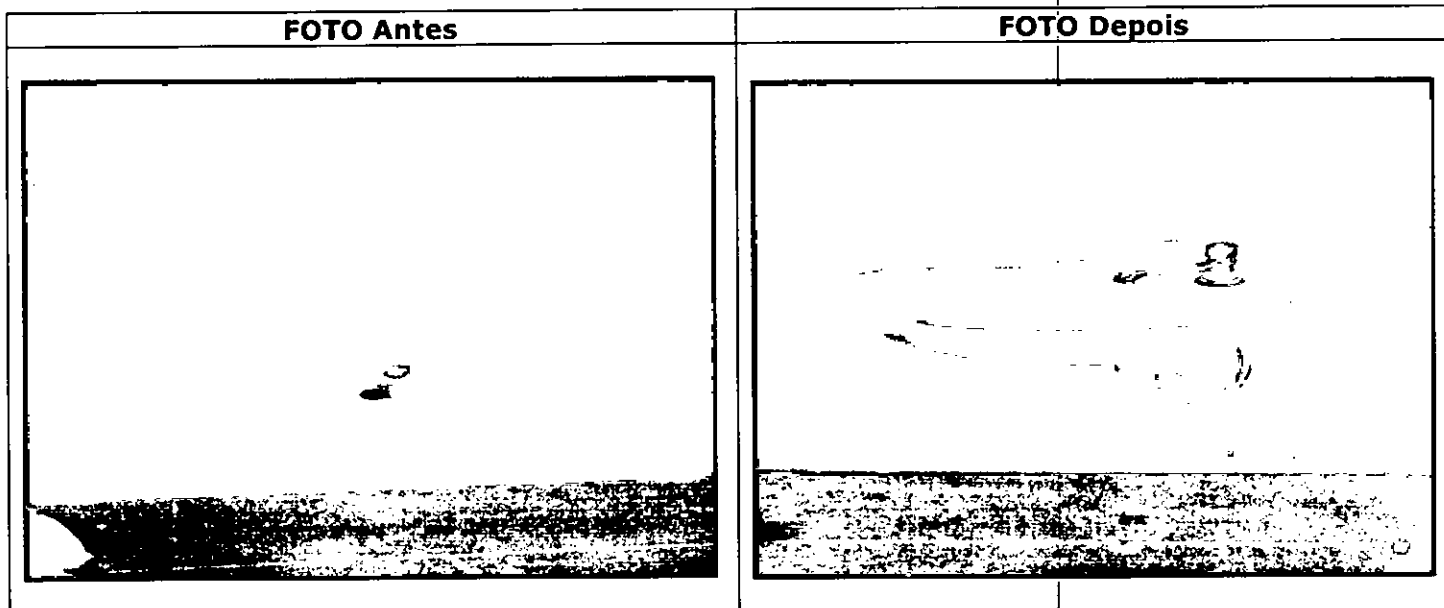
*Pompilio Sampaio Neto*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA



# EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP

Relatório de Atividade Diária - RAD


Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA  
Nome: CÁSSIO BARRETO      Função: Estagiário



PROBLEMA:

SOLUÇÃO: Instalação de lavatório

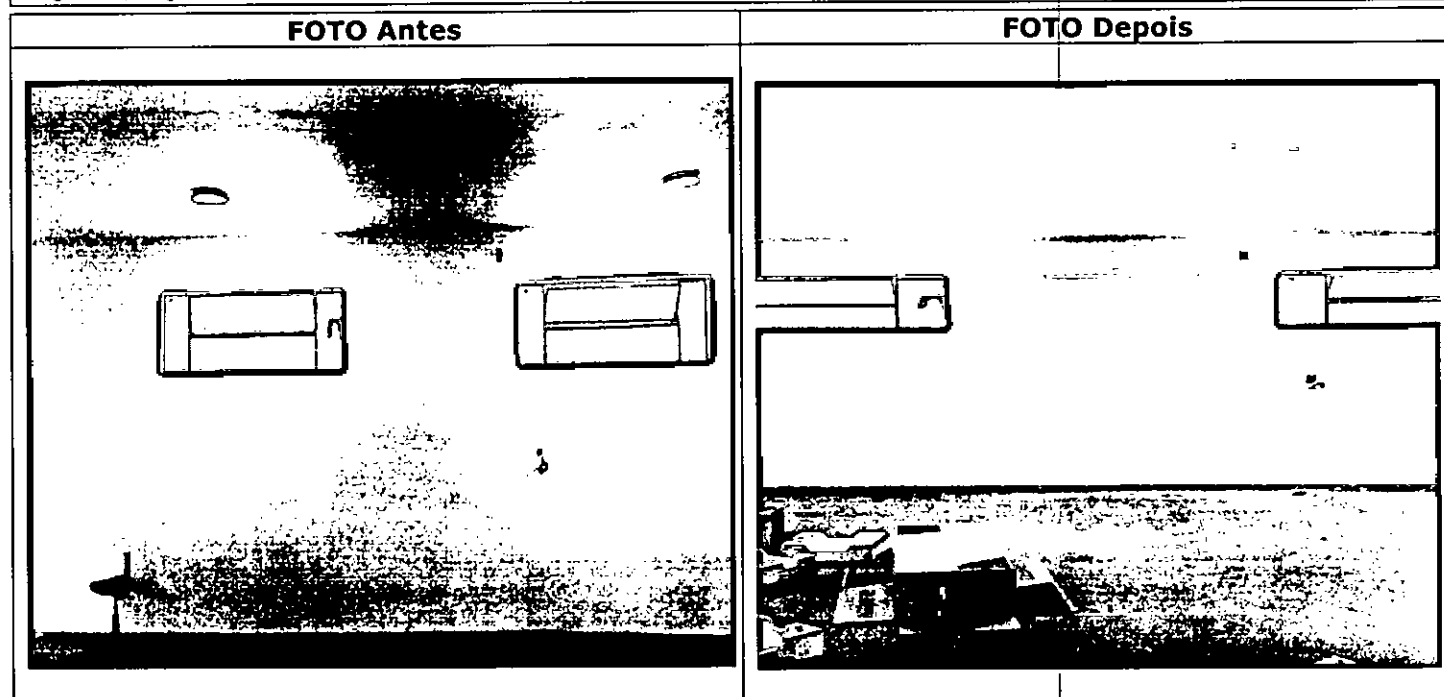EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN



PROBLEMA:

SOLUÇÃO: Instalação de ar condicionado

EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN

*Pomilio Sampaio Neto*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
EQUIPE - BAHIA

EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000  
SUPERVISOR: CÁSSIO BARRETO - TEL: (73) 98111-0839

*Gabriel de Andrade Cerqueira*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0519668457



# EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP

Relatório de Atividade Diária - RAD

Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA  
Nome: Cássio Barreto      Função: Estagiário

FOTO Antes	FOTO Depois
PROBLEMA:	
SOLUÇÃO: Instalação do chuveiro	
EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN	

FOTO Antes	FOTO Depois
PROBLEMA:	
SOLUÇÃO: Revestimento da parede, Instalação do chuveiro, área banheiro	
EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN	

*Pompilio Sampaio Neto*  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA

EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000  
SUPERVISOR: Cássio Barreto - TEL: (73) 98111-0839



# EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP

Relatório de Atividade Diária - RAD

## REFORMA IMEDATA DO PRONTO ATENDIMENTO - PA

Nome: CÁSSIO BARRETO

FOTO Antes

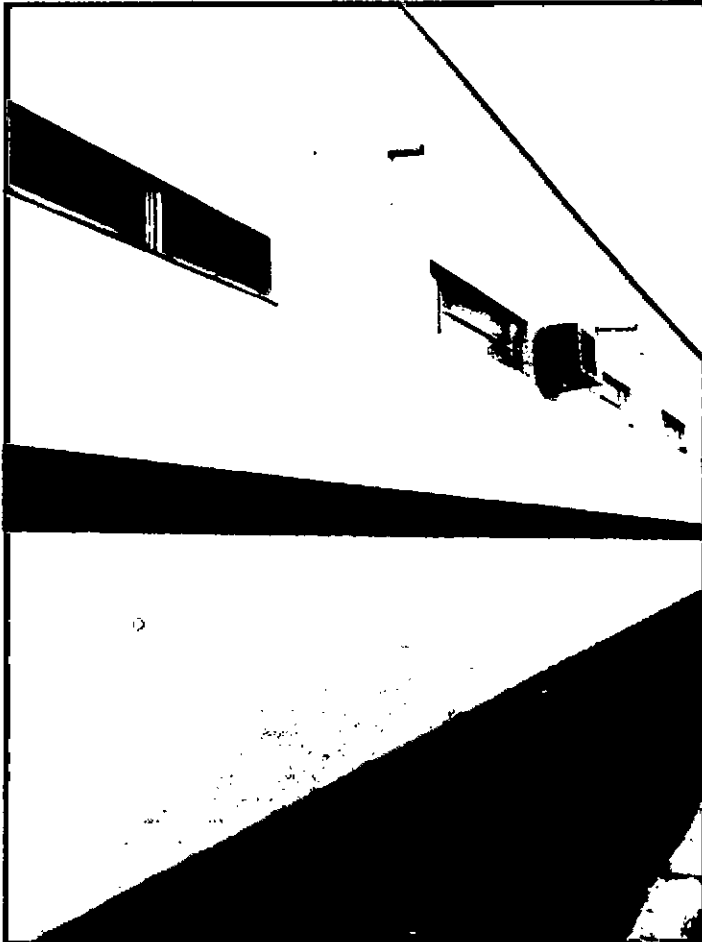



FOTO Depois



EQUIPE/EQUIPAMENTO: EPAN

  
Gabriel de Andrade Carneiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA n° 0519688457

  
Pompilio Sampaio Neto  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA-BA 10371  
EPAN CONSTRUTORA LTDA. - EPP  
CNPJ 03.833.213/0001-92  
JEQUIÉ - BAHIA

EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP / CNPJ: 03.833.213/0001-92  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ/BA, 45.202-000  
SUPERVISOR: CÁSSIO BARRETO - TEL: (73) 98111-0839


<b>EPAN CONSTRUTORA LTDA</b>				<b>DIÁRIO DE OBRA</b>			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				Data: 23/03/2021		Resumo das Pags 1/10	
Resp. Técnico: Pompílio Sampaio Neto				CREA 10371-BA			
Obra:		Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA		Tempo:	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Horário de Trabalho:		7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00		Manhã			
				Tarde			
				Noite			
Equipam./ Ferram.	Marreta, Andaimos, Plataformas;			Pá; Enxada; Alavanca; Carro de Mão;			
	Ponteiro, Talhadeira, Furadeira			Caçamba;			
	Alicate, Serra Marmore, Desempenadeira						
Pessoal	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	00			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Bombeiro	00			
	Carpinteiro	01	Eletricista	01			
	Pedreiro	02	Pintor	01			
	Armador	00	Vidraceiro	01			
	Servente	03	Gesseiro	01			
Serviços Executados	Troca de calha; bica.						
	Remoção do telhado de zinco;						
	Preparação para a execução do forro de gesso;						
	Preparação para instalação de ar-condicionado;						
	Revisão de instalações elétricas;						
	Trocas de marcos, aduelas, portas e alisages, nos banheiros;						
	Revestimento cerâmico no banheiro;						
	Execução de tubulação para chuveiro elétrico;						
	Instalação das pias das farmacia e cozinha;						
	Instalação de lavatórios;						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 23/03/2021	

  
**Gabriel de Andrade Cerqueira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 0519688457

  
**Pompílio Sampaio Neto**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-BA 10371




<b>EPAN CONSTRUTORA LTDA</b>				<b>DIÁRIO DE OBRA</b>			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				Data: 25/03/2021		Resumo das Pags 3/10	
Resp. Técnico: Pompílio Sampaio Neto		CREA 10371-BA					
Obra:		Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA		Tempo:	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Horário de Trabalho:		7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00		Manhã			
				Tarde			
				Noite			
Equipam./ Ferram.	Marreta, Andaimos, Plataformas;			Pá; Enxada; Alavanca; Carro de Mão;			
	Ponteiro, Talhadeira, Furadeira			Caçamba;			
	Alicate, Serra Marmore, Desempenadeira						
Pessoal	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	00			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Bombeiro	00			
	Carpinteiro	01	Eletricista	01			
	Pedreiro	02	Pintor	01			
	Armador	00	Vidraceiro	01			
	Servente	03	Gesseiro	01			
Serviços Executados	Execução do telhado de zinco;						
	Execução do forro de gesso;						
	Instalação de ar-condicionado;						
	Revisão de instalações elétricas;						
	Trocas de marcos, aduelas, portas e alisages, nos banheiros;						
	Execução de massa corrida;						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 25/03/2021	

  
 Gabriel de Andrade Cerqueira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 0519688457

  
 Pompílio Sampaio Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-BA 10371

EPAN CONSTRUTORA LTDA			DIÁRIO DE OBRA			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ			Data: 26/03/2021		Resumo das Pags 4/10	
Resp. Técnico: Pompílio Sampaio Neto		CREA 10371-BA				
Obra:	Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA		Tempo:	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Horário de Trabalho:		7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00		Manhã		
				Tarde		
				Noite		
Equipam./ Ferram.	Marreta, Andaimes, Plataformas;		Pá; Enxada; Alavanca; Carro de Mão;			
	Ponteiro, Talhadeira, Furadeira		Caçamba;			
	Alicate, Serra Marmore, Desempenadeira					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	00		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Bombeiro	00		
	Carpinteiro	01	Eletricista	01		
	Pedreiro	02	Pintor	01		
	Armador	00	Vidraceiro	01		
	Servente	03	Gesseiro	01		
Serviços Executados	Execução do telhado de zinco;					
	Execução do forro de gesso;					
	Instalação de ar-condicionado;					
	Revisão de instalações elétricas;					
	Trocas de marcos, aduelas, portas e alisages, nos banheiros;					
	Execução de massa corrida;					
Anotação da Fiscalização						
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:		Data: 26/03/2021	

  
 Gabriel de Andrade Cerqueira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 0519688457

  
 Pompílio Sampaio Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-BA 10371


EPAN CONSTRUTORA LTDA				DIÁRIO DE OBRA			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				Data: 29/03/2021		Resumo das Pags 5/10	
Resp. Técnico: Pompílio Sampaio Neto		CREA 10371-BA					
Obra:		Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA		Tempo:	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Horário de Trabalho:		7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00		Manhã			
				Tarde			
				Noite			
Equipam./ Ferram.	Marreta, Andaimos, Plataformas;		Pá, Enxada, Alavanca, Carro de Mão;				
	Ponteiro, Talhadeira, Furadeira		Caçamba;				
	Alicate, Serra Marmore, Desempenadeira						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		00	
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Bombeiro		00	
	Carpinteiro		01	Eletricista		01	
	Pedreiro		02	Pintor		01	
	Armador		00	Vidraceiro		01	
	Servente		03	Gesseiro		01	
Serviços Executados	Execução do forro de gesso;						
	Instalação de ar-condicionado;						
	Revisão de instalações elétricas;						
	Execução de massa corrida;						
	Execução de forro PVC na área do estacionamento;						
	Início de execução das portas de blindex;						
	Revestimento do vidros dos vitrôs;						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 29/03/2021	

  
 Gabriel de Andrade Cerqueira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 0519688457

  
 Pompílio Sampaio Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-BA 10371

<b>EPAN CONSTRUTORA LTDA</b>				<b>DIÁRIO DE OBRA</b>			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				Data: 30/03/2021		Resumo das Pags 6/10	
Resp. Técnico: Pompílio Sampaio Neto		CREA 10371-BA					
Obra: Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA		Tempo:		Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
		Manhã					
		Tarde					
		Noite					
Horário de Trabalho:		7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00					
Equipam./ Ferram.	Marreta, Andaimos, Plataformas;		Pá, Enxada; Alavanca; Carro de Mão;				
	Ponteiro, Talhadeira, Furadeira		Caçamba;				
	Alicate, Serra Marmore, Desempenadeira						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		00	
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Bombeiro		00	
	Carpinteiro		01	Eletricista		01	
	Pedreiro		02	Pintor		01	
	Armador		00	Vidraceiro		01	
	Servente		03	Gesseiro		01	
Serviços Executados	Execução do forro de gesso;						
	Instalação de ar-condicionado;						
	Revisão de instalações elétricas;						
	Execução de massa corrida;						
	Execução de forro PVC na área do estacionamento;						
	Início de execução das portas de blindex;						
	Revestimento do vidros dos vitrôs;						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 30/03/2021	

  
**Gabriel de Andrade Cerqueira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 0519688457

  
**Pompílio Sampaio Neto**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-BA 10371

<b>EPAN CONSTRUTORA LTDA</b>				<b>DIÁRIO DE OBRA</b>			
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				Data: 31/03/2021		Resumo das Pags 7/10	
Resp. Técnico: Pompilio Sampaio Neto		CREA 10371-BA					
Obra:		Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA		Tempo:	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Horário de Trabalho:		7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00		Manhã			
				Tarde			
				Noite			
Equipam./ Ferram.	Marreta, Andaimos, Plataformas;		Pá; Enxada; Alavanca; Carro de Mão;				
	Ponteiro, Talhadeira, Furadeira		Caçamba;				
	Alicate, Serra Marmore, Desempenadeira						
Pessoal	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	00			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Bombeiro	00			
	Carpinteiro	01	Eletricista	01			
	Pedreiro	02	Pintor	01			
	Armador	00	Vidraceiro	01			
	Servente	03	Gesseiro	01			
Serviços Executados	Execução do forro de gesso;						
	Instalação de ar-condicionado;						
	Revisão de instalações elétricas;						
	Execução de massa corrida;						
	Execução de forro PVC na área do estacionamento;						
	Execução das portas de blindex;						
	Revestimento do vidros dos vitrôs;						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 31/03/2021	

  
**Gabriel de Andrade Cerqueira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 0519688457

  
**Pompilio Sampaio Neto**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-BA 10371

<b>EPAN CONSTRUTORA LTDA</b>				<b>DIÁRIO DE OBRA</b>			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				Data: 01/04/2021		Resumo das Pags 8/10	
Resp. Técnico: Pompilio Sampaio Neto		CREA 10371-BA					
Obra:		Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA		Tempo:	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Horário de Trabalho:		7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00		Manhã			
				Tarde			
				Noite			
Equipam./ Ferram.	Marreta, Andaimes, Plataformas;		Pá; Enxada; Alavanca; Carro de Mão;				
	Ponteiro, Talhadeira, Furadeira		Caçamba;				
	Alicate, Serra Marmore, Desempenadeira						
Pessoal	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	00			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Bombeiro	00			
	Carpinteiro	01	Eletricista	01			
	Pedreiro	02	Pintor	01			
	Armador	00	Vidraceiro	01			
	Servente	03	Gesseiro	01			
Serviços Executados	Execução do forro de gesso;						
	Instalação de ar-condicionado;						
	Revisão de instalações elétricas;						
	Execução de lixamento e pintura;						
	Execução de forro PVC na área do estacionamento;						
	Execução das portas de blindex;						
	Revestimento do vidros dos vitrôs;						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 01/04/2021	

  
**Gabriel de Andrade Cerqueira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 0519688457

  
**Pompilio Sampaio Neto**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-BA 10371

<b>EPAN CONSTRUTORA LTDA</b>				<b>DIÁRIO DE OBRA</b>			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ</b>				<b>Data: 05/04/2021</b>		<b>Resumo das Pags 9/10</b>	
<b>Resp. Técnico: Pompilio Sampaio Neto</b>		<b>CREA 10371-BA</b>					
<b>Obra:</b>	<b>Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA</b>			<b>Tempo:</b>	<b>Bom/Ruim</b>	<b>Chuva Fraca</b>	<b>Chuva Forte</b>
<b>Horário de Trabalho:</b>		<b>7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00</b>		<b>Manhã</b>			
				<b>Tarde</b>			
				<b>Noite</b>			
<b>Equipam./ Ferram.</b>	Marreta, Andaimos, Plataformas;			Pá; Enxada; Alavanca; Carro de Mão;			
	Ponteiro, Talhadeira, Furadeira			Caçamba;			
	Alicate, Serra Marmore, Desempenadeira						
<b>Pessoal</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	00			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Bombeiro	00			
	Carpinteiro	01	Eletricista	01			
	Pedreiro	02	Pintor	01			
	Armador	00	Vidraceiro	01			
	Servente	03	Gesseiro	01			
<b>Serviços Executados</b>	Revisão de instalações elétricas;						
	Execução de lixamento e pintura;						
	Instalação das luminárias e refletor na área do estacionamento;						
	Execução das portas de blindex;						
	Revestimento do vidros dos vitrôs;						
	Instalação de iluminação da sala principal;						
<b>Anotação da Fiscalização</b>							
<b>Visto Fiscalização:</b>				<b>Visto Contratada:</b>		<b>Data: 05/04/2021</b>	

  
**Gabriel de Andrade Cerqueira**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-BA nº 0519688457**

  
**Pompilio Sampaio Neto**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA-BA 10371**

<b>EPAN CONSTRUTORA LTDA</b>				<b>DIÁRIO DE OBRA</b>			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				Data: 06/04/2021		Resumo das Pags 10/10	
Resp. Técnico: Pompílio Sampaio Neto		CREA 10371-BA					
Obra:		Reforma Imediata do Pronto Atendimento - PA		Tempo:	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Horário de Trabalho:		7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00		Manhã			
				Tarde			
				Noite			
Equipam./ Ferram.	Marreta, Andaimos, Plataformas;		Pá; Enxada; Alavanca; Carro de Mão;				
	Ponteiro, Talhadeira, Furadeira		Caçamba;				
	Alicate, Serra Marmore, Desempenadeira						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	00			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Bombeiro	00			
	Carpinteiro	01	Eletricista	01			
	Pedreiro	02	Pintor	01			
	Armador	00	Vidraceiro	01			
	Servente	03	Gesseiro	01			
Serviços Executados	Finalização de revisão de instalações elétricas;						
	Finalização de pintura;						
	Finalização da execução das portas de blindex;						
	Finalização revestimento do vidros dos vitrôs;						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 06/04/2021	

  
 Gabriel de Andrade Cerqueira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 0519688457

  
 Pompílio Sampaio Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-BA 10371

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.833.213/0001-92

**Razão Social:** EPAN CONSTRUTORA LTDA EPP

**Endereço:** R SIQUEIRA CAMPOS 110 / JOAQUIM ROMAO / JEQUIE / BA / 45202-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/03/2021 a 20/04/2021

**Certificação Número:** 2021032204054336860941

Informação obtida em 05/04/2021 09:39:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EPAN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 03.833.213/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:07:47 do dia 16/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2021. 7

Código de controle da certidão: B4A8.121D.CC55.0664

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20211392659

RAZÃO SOCIAL	
EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
053.275.936 - BAIXADO	03.833.213/0001-92

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/04/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EPAN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.833.213/0001-92

Certidão nº: 11593414/2021

Expedição: 05/04/2021, às 09:48:09

Validade: 01/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EPAN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.833.213/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - BA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 9734 / 2021**

**CONCEDIDO À**

**Nome/Razão Social:** EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 03.833.213/0001-92  
**Endereço:** Rua RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 - JOAQUIM ROMÃO - - CEP:  
45200-557

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências contra o portador do cadastro de pessoa física especificado, relativas a tributos administrativos pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Jequié, na Internet, no endereço <http://www.jequie.ba.gov.br>

Emitida em: 05/04/2021

**Validade: 90 dias**

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - Bahia, Segunda-feira, 5 de Abril de 2021

**Chave de validação: 48b8ce68**

**Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho - CEP: 45208-903**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/03/2021 HORA: 11:23:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

EPAN CONSTRUTORA LTDA

R SIQUEIRA CAMPOS 110

JOAQUIM ROMAO

JEQUIE

(7300) 35250794

45202-000

BA

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.833.213/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 250,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 250,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TÓTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500000029

508502702009

303833213001

019220210293



## Seu agendamento foi concluído!



### Pix é Inter

Cadastre suas chaves Pix do Inter e tenha o seu Pixback.

Conheça

### Dados do beneficiário

Nome do beneficiário

GPS

### Dados do pagamento

Valor	Desconto
R\$ 250,85	R\$ 0,00
Juros	Taxa
R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total a pagar	Data da operação
R\$ 250,85	09/03/2021
Data de vencimento	Data do agendamento
09/03/2021	09/03/2021
Descrição	
INSS fevereiro 2021 EPAN	
Código de barras	
85850000020508502702009303633213001019270210293	

### Dados do pagador final

Nome do pagador

FRANKLIN ECA BELEM 97172910599

Agência

0001-9

Caixa

50290630



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/03/2021 - 11:51:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EPAN CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (7300)35250794
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.800,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.833.213/0001-92	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 31/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 304,00	14-ENCARGOS 16,72	15-TOTAL A RECOLHER 320,72
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/03/2021\*\*

858600000039 207201802104 331650183800 383321300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



### Pagamento realizado!

**Pix é Inter**  
Cadastre suas chaves Pix no Inter e participe do seu cashback.  
[Cadastrear](#)

#### Dados do beneficiário

Nome do beneficiário  
**FGTS GRF CONVENIO 180**

#### Dados do pagamento

Valor	Debito em nome
<b>RS 320,72</b>	<b>RS 0,00</b>
Juros	Multa
<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>

Total a pagar	Data da cobrança
<b>RS 320,72</b>	<b>09/03/2021</b>

Data de vinculação	Data de pagamento
<b>31/03/2021</b>	<b>09/03/2021</b>

Descrição  
**FGTS EPAN Edinho**

Código do banco  
**RS86000000003070720160210402165018380096332100019**

#### Dados do pagador final

Nome do credidor  
**FRANKLIN ECA BELEM 97172910559**

Agência	Código
<b>0001-9</b>	<b>50290630</b>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021  
HORA: 11:23:26  
PÁG : 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000034 040001802100 307650180808 383321300019

EMPRESA: EPAN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: EPAN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 03.833.213/0001-92  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 03.833.213/0001-92

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB JAM
ERISNEIDE REIS DOS SANTOS			120.79143.60-5		01/09/2019				03516
1.500,00	0,00		0,00	118,50			120,00	0,00	
GLECIO SANTOS BARBOSA			200.81656.83-6		01/09/2019				07152
1.200,00	0,00		0,00	91,50			96,00	0,00	
JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA			126.79019.04-2		01/08/2011				07170
1.100,00	0,00		0,00	82,50			88,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
3.800,00

0,00

0,00

292,50

304,00

0,00

03833213000192		<b>DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO</b>			
R SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMAO. CEP. 45202000 - JEQUIE (BA)		Mês de Referência: fevereiro/2021			
Colaborador:	2	JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA		Admissão:	01/08/2011
Cargo:	717020 - Servente de obras				
Tomador:	EPAN CONSTRUTORA LTDA				
CTPS/Série:	15460000/00043-	CPF:	89758820559	PIS/PASEP:	12679019042
				Categoria:	1
Descrição		Referência		Provento	Desconto
SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.100,00	
INSS		7,50	%		82,50
				Total Provento	Total Desconto
				1.100,00	82,50
				Valor Líquido	1.017,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	0,00	

software by www.sismont.com.br

Contabilidade Barbosa Ltda

Recorte aqui

EPAN CONSTRUTORA LTDA		<b>DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO</b>			
03833213000192		Mês de Referência: fevereiro/2021			
R SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMAO. CEP. 45202000 - JEQUIE (BA)					
Colaborador:	3	GLECIO SANTOS BARBOSA		Admissão:	01/09/2019
Cargo:	715210 - Pedreiro				
Tomador:	EPAN CONSTRUTORA LTDA				
CTPS/Série:	9311052/00010-	CPF:	03055267583	PIS/PASEP:	20081656836
				Categoria:	1
Descrição		Referência		Provento	Desconto
SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.200,00	
SALARIO FAMILIA		1,00	cota(s)	51,27	
INSS		7,62	%		91,50
				Total Provento	Total Desconto
				1.251,27	91,50
				Valor Líquido	1.159,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	0,00	

software by www.sismont.com.br

Contabilidade Barbosa Ltda

Recorte aqui

EPAN CONSTRUTORA LTDA		<b>DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO</b>			
03833213000192		Mês de Referência: fevereiro/2021			
R SIQUEIRA CAMPOS, 110, JOAQUIM ROMAO. CEP. 45202000 - JEQUIE (BA)					
Colaborador:	1	ERISNEIDE REIS DOS SANTOS		Admissão:	01/09/2019
Cargo:	351605 - Técnico em segurança no trabalho				
Tomador:	EPAN CONSTRUTORA LTDA				
CTPS/Série:	3941600/00016-	CPF:	98494740504	PIS/PASEP:	12079143605
				Categoria:	1
Descrição		Referência		Provento	Desconto
SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.500,00	
INSS		7,90	%		118,50
				Total Provento	Total Desconto
				1.500,00	118,50
				Valor Líquido	1.381,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	0,00	

software by www.sismont.com.br

Contabilidade Barbosa Ltda

*[Assinatura]*  
Assinatura

Data

*[Assinatura]*  
Assinatura

Data

*[Assinatura]*  
Assinatura

07/02/2021  
Data



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

### Informações da obra

Número de inscrição da obra  
90.003.44070/78

Nome da obra  
EPAN CONSTRUTORA LTDA

Data do cadastramento  
19/05/2020 11:42

Origem do cadastramento  
e-CAC

Data do início da obra  
06/03/2020

CNAE  
4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

Situação  
Ativa

Data  
06/03/2020

### Endereço

País  
BRASIL

Município  
JEQUIE

UF  
BA

CEP  
45.208-903

Bairro  
JEQUIEZINHO

Logradouro  
PRACA DUQUE DE CAXIAS S/N

Número  
SN

Complemento  
Sede da Prefeitura Municipal

### Responsável

Nome  
EPAN CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ  
03.833.213/0001-92

Vínculo  
Construtora

Data de início da responsabilidade  
06/03/2020

Data de término da responsabilidade

### Contratantes

CPF/CNPJ  
13.894.878/0001-60

Nome  
MUNICIPIO DE JEQUIE

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Edifício de Garagens	Alvenaria	1.599,71 m <sup>2</sup>
Acréscimo	Edifício de Garagens	Alvenaria	540,11 m <sup>2</sup>
Reforma	Edifício de Garagens	Alvenaria	890,75 m <sup>2</sup>
Demolição	Edifício de Garagens	Alvenaria	301,02 m <sup>2</sup>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONTRATO Nº 44/2021**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA IMEDIATA DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DO AMÉRICA, JEQUIÉ/BA, PARA A CRIAÇÃO DE LEITOS VISANDO ATENDIMENTO AOS PACIENTES INFECTADOS COM O CORONAVÍRUS, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E DO OUTRO A EMPRESA EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO:**

O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.894.878/0001-60, cuja sede da Prefeitura Municipal localiza-se na Praça Duque de Caxias S/N, Bairro do Jequezinho, Jequié-Bahia, neste ato, representado pelo seu Prefeito, o Sr. Zenildo Brandão Santana, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 801960126 - expedida pela SSP/BA, CPF n.º 917.331.035-20, doravante denominado abreviadamente MUNICÍPIO e EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP, com endereço na Rua Siqueira Campos n.º 110, Bairro Joaquim Romão, Jequié/BA CEP: 45.202-000, inscrita no CNPJ sob n.º 03.833.213/0001-92, neste ato, representado por seus representantes legais o Srº Belizario Cerqueira Mattos, inscrito no CPF sob n.º 030.064.925-87 e RG n.º 00.267.881-01 SSP/BA, e o Srº Edvaldo Cerqueira de Mattos Filho, inscrito no CPF sob n.º 125.383.455-53 e RG n.º 02.326.554-05 SSP/BA, representantes legais infra, doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, celebram este contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento Legal**

O presente instrumento é celebrado com fundamento legal no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, que disciplina o caso de **Dispensa de Licitação de nº 33/2021**.

**Cláusula Segunda – Objeto**

Contratação de Empresa Especializada para realização de reforma imediata do Pronto Atendimento - PA, localizada no bairro Campo do América, Jequié/BA, para a criação de leitos visando atendimento aos pacientes infectados com o coronavírus.

**Cláusula Terceira – Prazo**

O presente instrumento é celebrado por prazo determinado, com vigência de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura deste termo, podendo ser aditado nos termos da Lei 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro** - O serviço deverá ocorrer em normais condições, conforme cronograma fornecido pela CONTRATANTE, observando as especificações na ordem de serviço.



É trabalho. É vida melhor.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Parágrafo Segundo** - As modificações ou prorrogações necessárias, somente serão admitidas se previamente autorizados pela **CONTRATANTE**.

**Cláusula Quarta – Valor**

O valor do presente instrumento é de R\$ 51.065,42 (cinquenta e um mil, sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), que corresponde à remuneração devida pelo **MUNICÍPIO** à **CONTRATADA** pela execução do objeto descrito na cláusula segunda.

**Parágrafo único** – O pagamento será efetuado pelo **MUNICÍPIO**, no prazo de 30 (trinta) dias, após as medições e verificações com a conformidade dos serviços executados, pelo preposto da Administração.

**Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária**

As despesas derivadas deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária e de créditos adicionais específicos, se necessários, previstos na verba Orçamentária do Poder Executivo.

Unidade:	03 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Proj./Ativ.:	2147 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INST. E COMUNICAÇÃO
Elemento:	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Cláusula Sexta - Obrigações Gerais**

Além das obrigações anteriormente elencadas neste instrumento contratual, a **CONTRATADA** obriga-se a:


a) Submeter-se à fiscalização de preposto do Município, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e em conformidade com o **D E C R E T O** Nº 22.315 - EM 27 DE JANEIRO DE 2021, artigo 1º - Secretaria Municipal de Saúde, sendo como responsável pela fiscalização o senhor André Vinícius Leandro Moura o que verificará os exatos termos do cumprimento contratual, devendo regularizar em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, todas as faltas observadas;

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

c) responsabilizar-se pelos danos e/ou prejuízos causados, por si ou por prepostos, ao **MUNICÍPIO** ou terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado;

d) responsabilizar-se diretamente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do contrato, isentando o Município de quaisquer obrigações contraídas com empregados, inclusive no que se refere a salários, férias, 13º salários, repousos semanais remunerados, horas extras ou quaisquer outros encargos decorrentes da relação de emprego de seu empregador;

**Parágrafo único** - A retenção de valores pelo **MUNICÍPIO** motivado pela ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas anteriores desta Cláusula, não isenta a **CONTRATADA** de efetivar a execução dos serviços prevista neste instrumento, e, em caso de regularização da obrigação pactuada no dispositivo contratual, os valores correspondentes serão liberados pelo **MUNICÍPIO**, sem incidência de juros ou correção monetária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Cláusula Sétima - Extinção E Rescisão Contratual**

O presente Contrato extinguir-se-á pela implementação do seu termo final, com o integral cumprimento das obrigações nele estipuladas, e, poderá ser rescindido, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigações pactuadas, e especialmente pela ocorrência das hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, cujos dispositivos a **CONTRATADA** declara conhecer, submetendo-se, irrestritamente, a todas as determinações estabelecidas.

**Cláusula Oitava - Multa e Penalidades**

O descumprimento de quaisquer obrigações, cláusulas, alíneas e itens deste Contrato, sujeitaram ao pagamento, por parte da contratada, de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total da remuneração pactuada, acrescido de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da remuneração por cada dia em que perdurar a infração e juros de 1% ao mês, ficando ainda, a **CONTRATADA** sujeita a todas as penalidades estipuladas nos Artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, se por qualquer meio ou motivo, justificadamente ou não, direta ou indiretamente, vier a dar causa a qualquer daqueles eventos.

**Cláusula Nona - Foro**

As partes contratantes comprometem-se ao integral cumprimento deste Contrato por si, herdeiros e ou sucessores, elegendo o foro da **Comarca de Jequié**, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outra decisão posterior, por mais privilegiado que seja para conhecer e dirimir as questões suscitadas deste instrumento.

E por estarem contratados e ajustados, as partes subscrevem este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em presença de duas (02) testemunhas instrumentais que também subscrevem para produção dos jurídicos e legais, sendo que uma das vias deste instrumento será entregue a **CONTRATADA**.


Jequié, 22 de março de 2021.


  
**ZENILDO BRANDÃO SANTANA**  
MUNICÍPIO


  
**EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP**  
CONTRATADA

  
**Kleber dos Santos de Jesus**  
Secretário Municipal de Controle e  
Transparência  
Decreto nº 22.065/21

**Testemunhas:**

1.   
CPF: 594.286.605-82

2.   
CPF: 815.729.035-87

  
**Daniel de Quadros Nogueira**  
Procurador Geral do Município de Jequié  
Decreto nº 22.227


## ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL SERVIÇO

**Ref.: Medição 01.**

Conforme inspeção “in loco”, constatamos para os devidos fins que os serviços referentes à contratação de empresa para reforma imediata do **PRONTO ATENDIMENTO - PA**, conforme especificações constantes do contrato e seus anexos, Contrato N° 44/2021, realizado pela empresa: **EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP**, inscrita no CNPJ sob o N° 03.833.213/0001-92, *foram executados* de acordo com a 1ª planilha de medição em anexo as especificações exigidas.

**Data da Execução: 23/03/2021 a 05/04/2021.**

Jequié, 06 de abril de 2021.

  
Gabriel de Andrade Cerqueira  
Engenheiro Civil  
CREA-BA n° 0519688457

**GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 0519688457

  
**POLLIANA LEANDRO OLIVEIRA**  
Secretaria Municipal da Saúde



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome BA 291800 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 60-4  
Conta corrente 71584-0

#### Creditado

Nome EPAN CONSTRUTORA LTDA  
Agência 1084-7  
Conta corrente 14845-8  
Valor 31.067,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD151293 ISNAIA SOUZA SANTOS  
JE695087 POLLIANA L OLIVEIRA

23/04/2021 16:26:34

23/04/2021 16:35:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE695087 POLLIANA L OLIVEIRA.
